



Consorcio del Agua de Lanzarote



INVERSIONES 2015 BALANCE ACTUACIONES 2014

14 enero 2014

BALANCE-EVOLUCIÓN INVERSIONES 2013-2015 A TRAVÉS DE LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DEL AGUA:

- **BALANCE ACTUACIONES 2014**

- **ACTUACIONES EJECUTADAS Y CERTIFICADAS 2013-2014**

- **ACTUACIONES EN EJECUCIÓN INICIADAS EN 2013-2014**


- **INVERSIONES PREVISTAS 2015**

BALANCE-EVOLUCIÓN INVERSIÓN PÚBLICA MEDIANTE CONTRATO GESTIÓN DEL AGUA

Inversión comprometida por Canal Gestión Lanzarote para 2013-2018 mediante contrato concesión para la gestión del servicio del agua en Lanzarote y La Graciosa	54.456.000
Previsión inversión anunciada para 2014	13.795.000
Previsión inversión anunciada para 2015	13.795.000

2014

Actuaciones comprometidas finalmente en este 2014 (algunas concluidas y otras en fase de ejecución)		23.058.545
Obras terminadas y certificadas	1.315.508	5.171.610
Obras en ejecución (partes certificadas)	3.856.102	
Actuaciones/obras adjudicadas y actualmente en ejecución		17.886.935



**Supone
un 67,15%
más de la
previsión
de
inversión
anunciada
para 2014**

BALANCE-EVOLUCIÓN INVERSIÓN PÚBLICA MEDIANTE CONTRATO GESTIÓN DEL AGUA

2015

Actuaciones con proyecto y en licitación	5.709.378
Actuaciones planificadas para ser comprometidas en 2015 por Canal Gestión	34.137.863
TOTAL	39.847.241

**BALANCE ACTUACIONES
2014**

INVERSIONES ANUNCIADAS PARA 2013/2014

Canal Gestión ha ejecutado y certificado 5.171.610 €, es decir, el 40% de sus compromisos anunciados para 2014 (13.795.000€)

Actualmente se están ejecutando obras ya adjudicadas por valor de 17.886.935 euros

En total durante 2014 se han comprometido y adjudicado 23.058.545 €, un 67,15% más de lo anunciado

**ACTUACIONES EJECUTADAS
Y CERTIFICADAS 2013-2014**

ACTUACIONES EJECUTADAS Y CERTIFICADAS EN 2014

DENOMINACIÓN PROYECTO

INVERSIÓN
PREVISTA
TOTALIDAD
PROYECTO

INVERSIÓN
REALIZADA
EN 2013-2014

DENOMINACIÓN PROYECTO	INVERSIÓN PREVISTA TOTALIDAD PROYECTO	INVERSIÓN REALIZADA EN 2013-2014
Construcción Emisario Salmuera Edam Janubio	154.000	144.560
Puesta al día y legalización grupo electrógeno en Punta de Los Vientos	11.000	7.158
Sistema de protección contra incendios en instalaciones de desalinización en Punta de Los Vientos	25.632	25.632
Puesta al día y legalización sistema de almacenamiento de productos químicos en Punta de Los Vientos	6.600	6.672
Adquisición, montaje y puesta en funcionamiento del sistema de saneamiento y dosificación de sosa cáustica en Punta de Los Vientos	27.500	20.844
Adquisición, reposición urgente de acoplamiento de presión para sustitución de los que eran inservibles en Punta de los Vientos	50.000	18.849
Sistema de ventilación del centro de transformación de la desaladora Lanzarote III	50.000	43.597
Renovación red distribución c/ Toledo en Arrecife	44.000	41.897
Renovación red distribución c/ Rafael Alberti en Tahíche	39.600	33.710
Renovación red c/ Arroró en Los Valles	35.200	31.720
Ampliación red transporte a depósito regulación de la Mareta en la Graciosa	2.200	2.276
Adecantamiento, demolición y desescombro depósitos I, II, III y IV Granja Cabildo	132.000	111.073
Cobertura provisional agujeros y desperfectos cubierta depósito Maneje	16.500	11.754
Renovación red distribución c/ Arco Iris en Arrieta	22.000	16.578
Renovación red distribución c/ Venecia en Puerto del Carmen	6.600	4.377
Renovación red distribución c/ Lucas Gutiérrez en Tahíche	7.150	6.429

ACTUACIONES EJECUTADAS Y CERTIFICADAS EN 2014


DENOMINACIÓN PROYECTO

INVERSIÓN
PREVISTA
TOTALIDAD
PROYECTO

INVERSIÓN
REALIZADA
EN 2013-2014

Construcción red transporte y distribución en Vallito de Uga	13.200	11.939
Construcción red transporte en aducción a Camping de Papagayo	3.300	2.759
Construcción bay-pass en estación bombeo de Trujillo Bajo en Arrieta	9.900	8.960
Renovación red de distribución de Órzola, fases I y II	303.383	195.390
Impermeabilizaciones depósitos regulación varios (Costa Teguisse, Tahíche y Órzola)	165.000	162.873
Equipamiento electromecánico para pretratamiento agitación y bombeo; y prensado de residuos en arqueta construida por el CIA en Edar de Tías	88.000	80.746
Reconstrucción total del colector general de aguas residuales de Haría	121.000	149.350
Renovación red de saneamiento c/ José Antonio en Arrecife	22.000	19.659
Vallado permimetral del recinto de la edar Arrecife I y Ebar Intermedia de Arrecife	27.500	24.860
Vallado perimetral del recinto del depósito de regulación de agua regenerada de Iryda	11.000	8.658
Adecuación, legalización industrial, adcentamiento y puesta en servicio de la antigua nave de almacenamiento de Chafariz para edificio de custodia de la flota del servicio	88.000	75.361
Rehabilitación del edificio Lanzarote I para oficinas de saneamiento y depuración	55.000	47.827
TOTAL	1.537.265	1.315.508

Localización geográfica de las inversiones finalizadas a 31 de diciembre de 2014

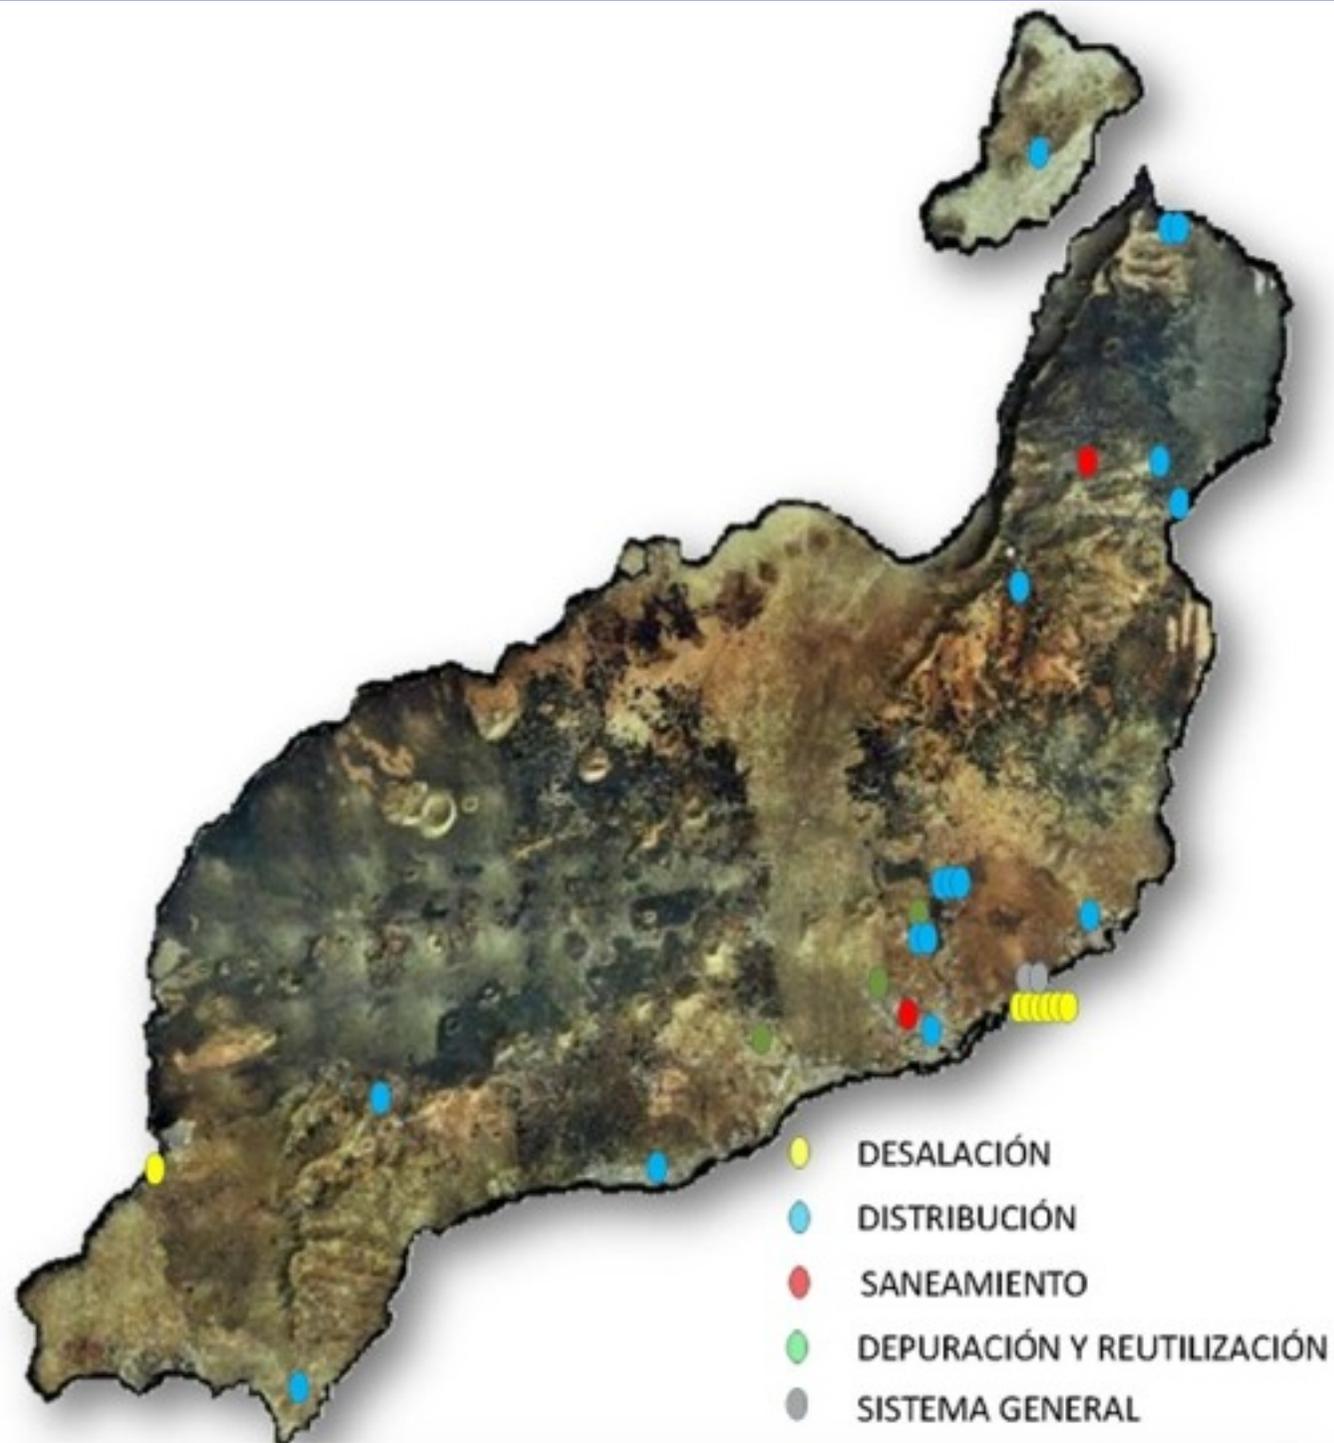

**ACTUACIONES EN
EJECUCIÓN INICIADAS EN
2013/2014**

ACTUACIONES ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN EN 2014

DENOMINACIÓN PROYECTO

INVERSIÓN
PREVISTA
TOTALIDAD
PROYECTO

INVERSIÓN
EJECUTADA
APROX A 31
DIC 2014

Remodelación integral de instalación desalación Lanzarote IV (Comenzó a ejecutarse en septiembre 2014)	4.070.000	13.200
Impermeabilización juntas de construcción y dilatación de los depósitos generales de agua producto de Punta de Los Vientos	100.000	32.119
Refuerzo estructural de los depósitos generales de agua producto en Punta de Los Vientos	148.000	6.000
Construcción de nuevo depósito de Zonzamas (Comenzó a ejecutarse en junio de 2014)	2.969.505	750.000
Renovación red distribución Teguisé	1.153.300	9.680
Renovación red distribución Arrieta-Punta Mujeres	983.789	9.250
Renovación red distribución Mácher	1.320.135	9.680
Renovación red distribución Arrecife centro-casco (Comenzó a ejecutarse en noviembre de 2014)	4.037.683	150.000
Renovación red distribución Las Breñas (Comenzó a ejecutarse en octubre 2014)	1.125.300	260.000
Renovación impulsión Janubio-Las Breñas (Comenzó en junio 2014)	522.500	500.000
Renovación red transporte Las Breñas-Playa Blanca (Comenzó en junio 2014)	1.705.000	1.520.000
Vallado y adecentamiento depósitos varios	275.000	88.570
Remodelación integral Ebares Puerto del Carmen (Comenzó en junio 2014)	1.271.775	150.000
Construcción nueva Ebar Calle Portugal (Comenzó en octubre 2014)	605.000	70.000

ACTUACIONES ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN EN 2014


DENOMINACIÓN PROYECTO

INVERSIÓN
PREVISTA
TOTALIDAD
PROYECTO

INVERSIÓN
EJECUTADA
APROX A 31
DIC 2014

Construcción nuevos tratamientos terciarios en Tías, Arrecife y Costa Teguisse (Comenzó en septiembre 2014)	1.374.450	250.000
Descontaminación, limpieza y adecentamiento de los tanques de almacenamiento de fuel en complejo de desalación Díaz Rijo, Punta de Los Vientos	39.600	34.963
Demolición de la estructura de la antigua desaladora de Explosivos Río Tinto para desconsolidar la situación de ruina estructural inminente	33.000	2.640
TOTAL	21.743.037	3.856.102

Localización geográfica de las actuaciones actualmente en ejecución

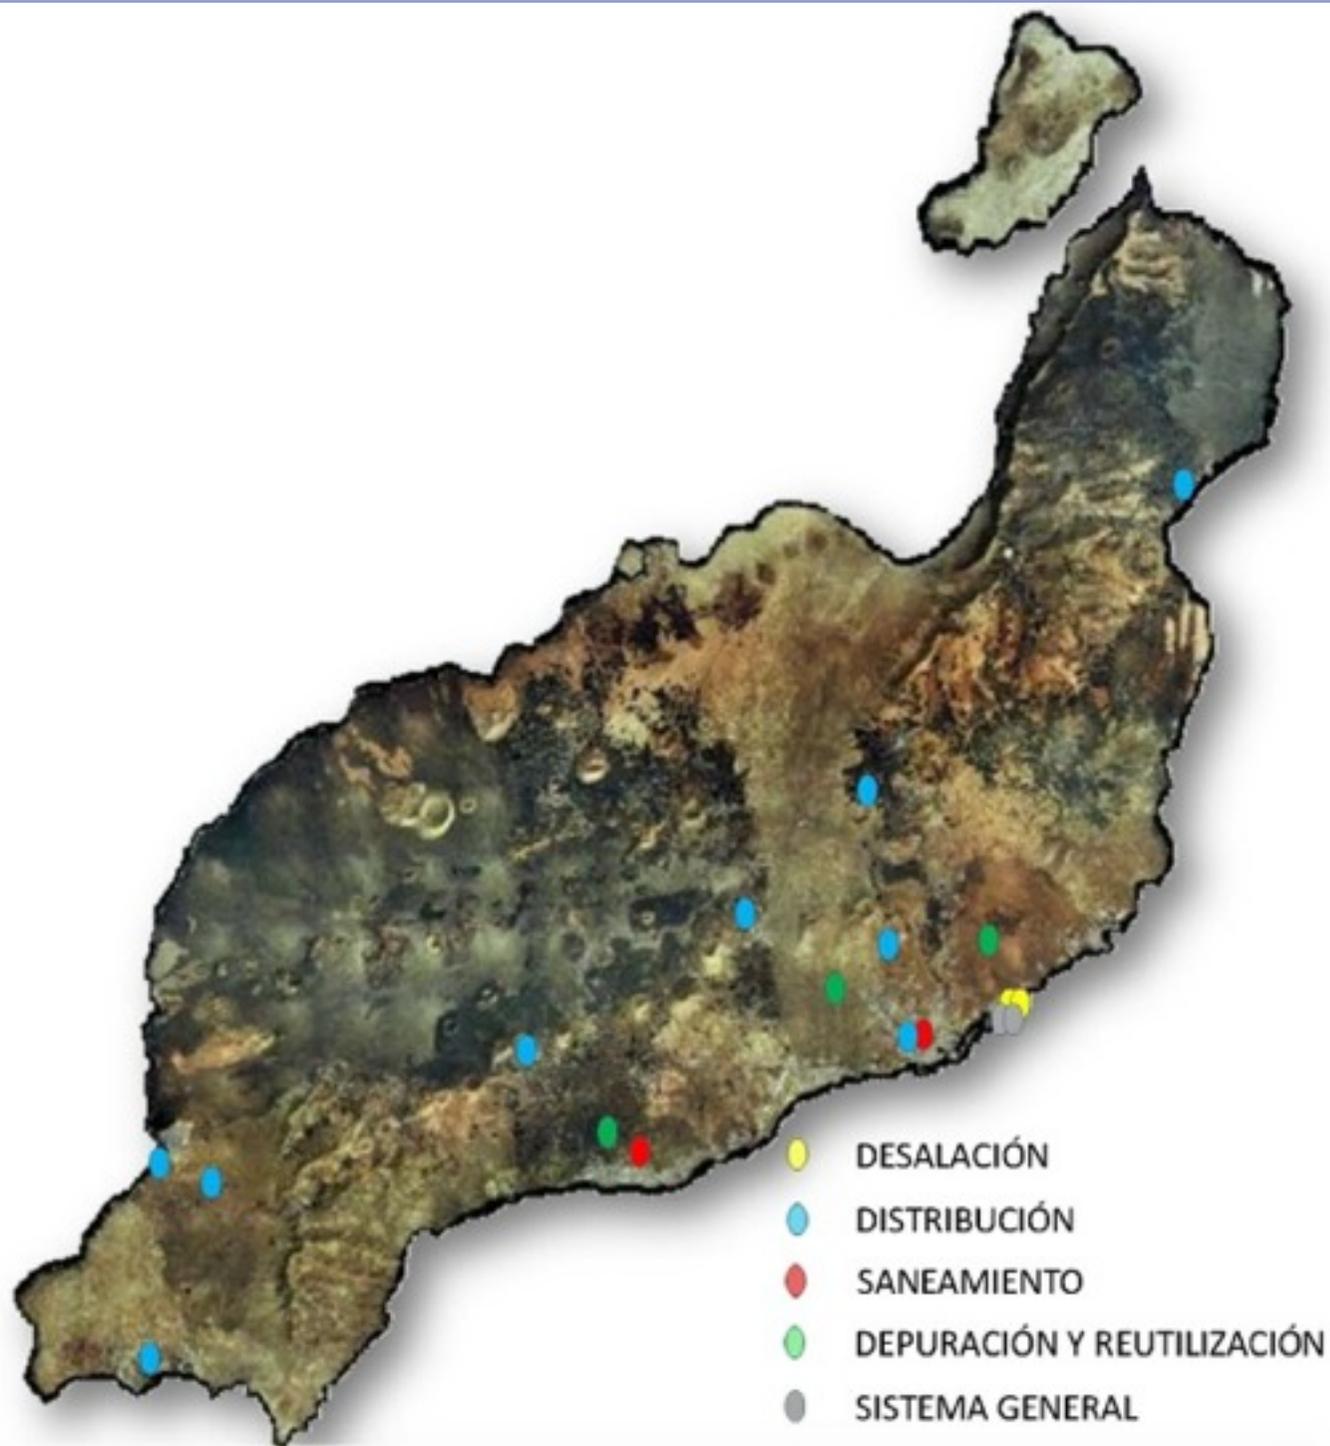

**INVERSIONES PREVISTAS EN
2015**

INVERSIONES PREVISTAS EN 2015


Canal Gestión iniciará en este nuevo año un nuevo paquete de inversiones que asciende a 40 millones de euros

INVERSIONES PREVISTAS EN 2015

Estimación del posible coste total de las nuevas actuaciones a iniciar en este año

39.847.241€


	DESALACIÓN	5.005.000
	DISTRIBUCIÓN	17.725.643
	SANEAMIENTO	1.282.983
	DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN	2.695.220
	SISTEMA GENERAL	13.138.395

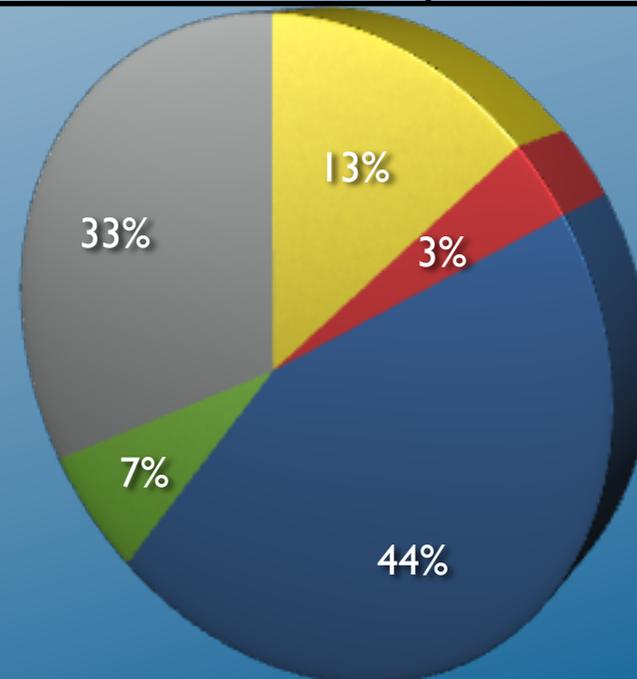



INVERSIONES PREVISTAS EN 2015

Estimación de la posible ejecución real en este año

***16.860.738 €**



	DESALACIÓN	825.000
	DISTRIBUCIÓN	5.170.000
	SANEAMIENTO	578.983
	DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN	1.823.360
	SISTEMA GENERAL	8.463.395

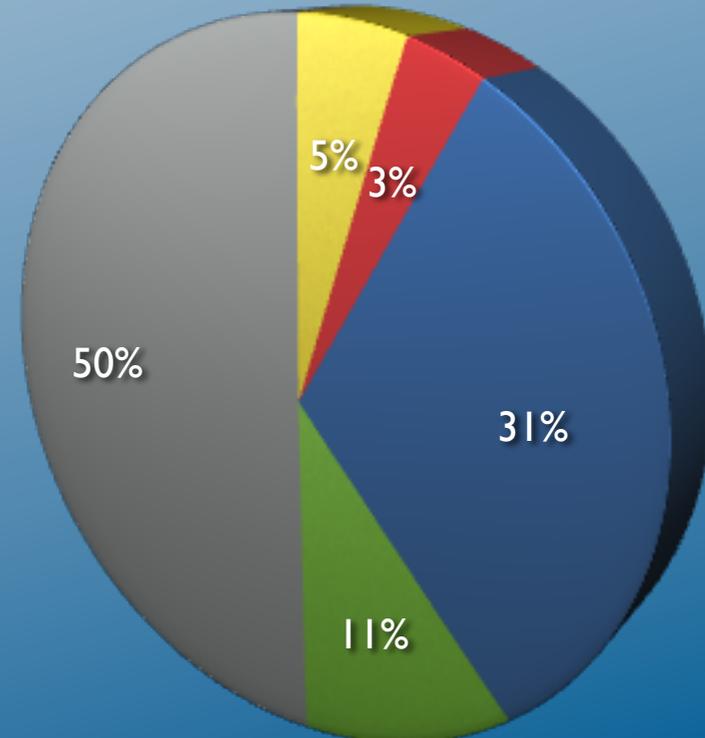

* Tener en cuenta que esta cantidad se incrementará con todo lo que se certifique de los 17.886.953 € adjudicados en 2014 y en ejecución en estos momentos.

ACTUACIONES CON PROYECTO Y EN LICITACIÓN 2015

DENOMINACIÓN PROYECTO

PRESUPUESTO PREVISTO

Renovación total impulsión Maneje-Montaña Mina-Lomo de Tesa	2.655.599
Renovación red transporte a Caleta de Famara	565.683
Red transporte Uga-Lomo de Tesa para cierre eje norte-centro-sur	1.870.000
Construcción del saneamiento del complejo de desalación Díaz Rijo	160.983
Adquisición de dos nuevas centrifugadoras en Edar Costa Teguse y Playa Blanca	110.000
Rehabilitación del edificio I de Chafariz para construcción de aseos y vestuario de todo el personal	210.321
Rehabilitación del edificio en ruina junto a las oficinas principales de Punta de Los Vientos para construcción de taller general de mantenimiento	136.792
TOTAL	5.709.378

ACTUACIONES PLANIFICADAS PARA SER COMPROMETIDAS EN 2015

DENOMINACIÓN PROYECTOS

PRESUPUESTO
PREVISTO
TOTALIDAD
PROYECTO

ANUALIDAD
PREVISTA
EJECUTAR 2015

ANUALIDADES
RESTANTES

DENOMINACIÓN PROYECTOS	PRESUPUESTO PREVISTO TOTALIDAD PROYECTO	ANUALIDAD PREVISTA EJECUTAR 2015	ANUALIDADES RESTANTES
Remodelación integral de la desaladora de Janubio	4.950.000	770.000	4.180.000
Reforma del centro de transformación desaladora Lanzarote IV	55.000	55.000	-
Renovación red de distribución Arrecife centro-norte	4.905.300	1.100.000	3.805.300
Renovación red de distribución La Asomada	2.011.949	550.000	1.461.949
Renovación red de distribución Conil	1.073.394	550.000	523.394
Construcción nuevo depósito de regulación norte	2.200.000	220.000	1.980.000
Construcción nuevo depósito de regulación centro	2.200.000	220.000	1.980.000
Remodelación depósitos Maneje	2.200.000	1.100.000	1.100.000
Nueva estación de bombeo del sistema norte y centro	2.145.000	440.000	1.705.000
Remodelación estación bombeo agua producto Punta de Los Vientos	990.000	990.000	-
Construcción sistema de telecontrol	4.400.000	825.000	3.575.000
Renovación equipos de medida	3.300.000	2.200.000	1.100.000
Construcción de instalaciones de almacenamiento de hipoclorito sódico	110.000	110.000	-

ACTUACIONES PLANIFICADAS PARA SER COMPROMETIDAS EN 2015

DENOMINACIÓN PROYECTOS

PRESUPUESTO
PREVISTO
TOTALIDAD
PROYECTO

ANUALIDAD
PREVISTA
EJECUTAR 2015


ANUALIDADES
REstantes

Construcción de tratamiento secundario Edar Haría	275.000	165.000	110.000
Reconstrucción depósitos y Ebarg de Tías	165.000	165.000	-
Reconstrucción obra civil ruinoso Edar Costa Teguisse	275.000	275.000	-
Remodelación y mejora de las edar de Tías, Arrecife y Órzola	242.000	242.000	-
Red de agua regenerada Montaña Mina-El Monte	137.500	137.500	-
Red de agua regenerada Montaña Mina-Lomo de Tesa	533.720	266.860	266.860
Red de agua regenerada Costa Teguisse	297.000	99.000	198.000
Depósitos de agua regenerada Lomo de Tesa y Costa Teguisse	550.000	253.000	297.000
Remodelación y mejora de las Ebares de Playa Honda	308.000	198.000	110.000
Remodelación y mejora de las Ebares de Costa Teguisse	374.000	110.000	264.000
Remodelación y mejora de las Ebares de Arrecife	440.000	110.000	330.000
TOTAL	34.137.863	11.151.360	22.986.503


Ejecución real prevista en 2015

5.709.378 + 11.151.360 = 16.860.738 €

**Localización
geográfica de
las actuaciones
con proyecto
cuyas
ejecuciones son
inminentes
2015**

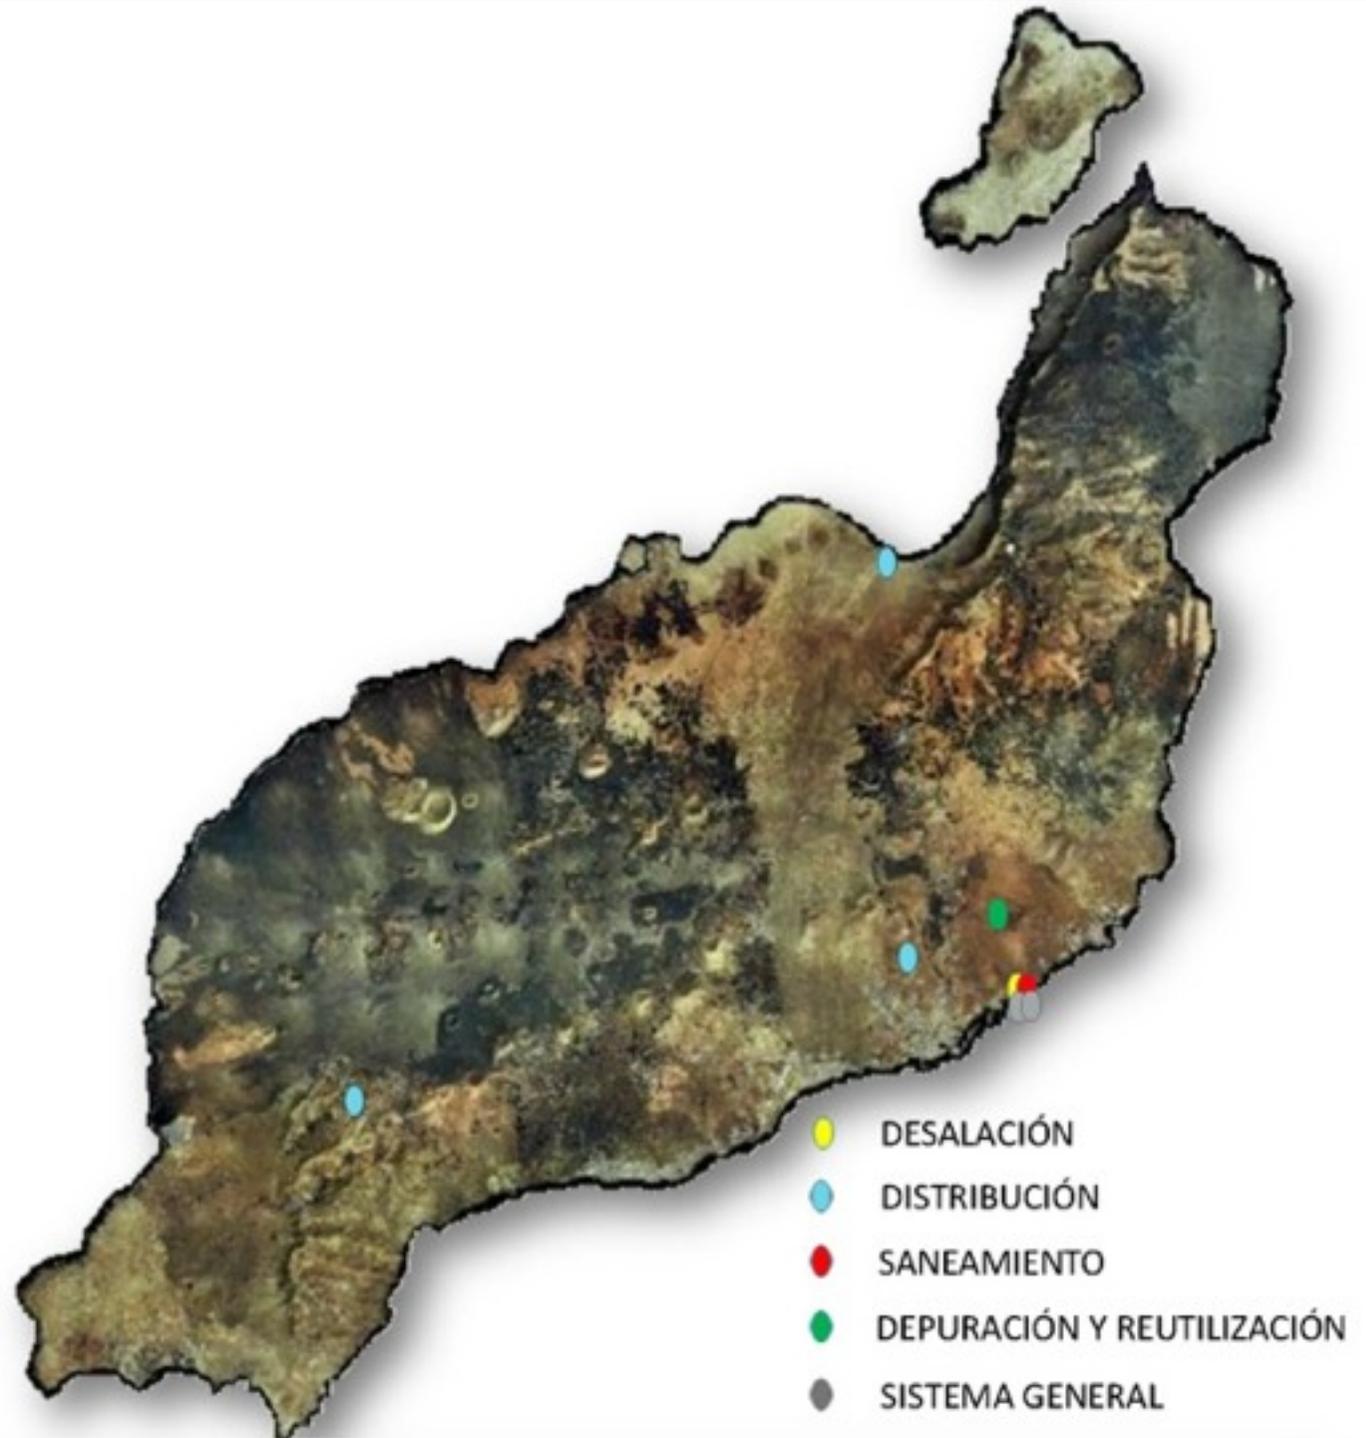

**Localización
geográfica de
las nuevas
inversiones a
licitar en este
2015**

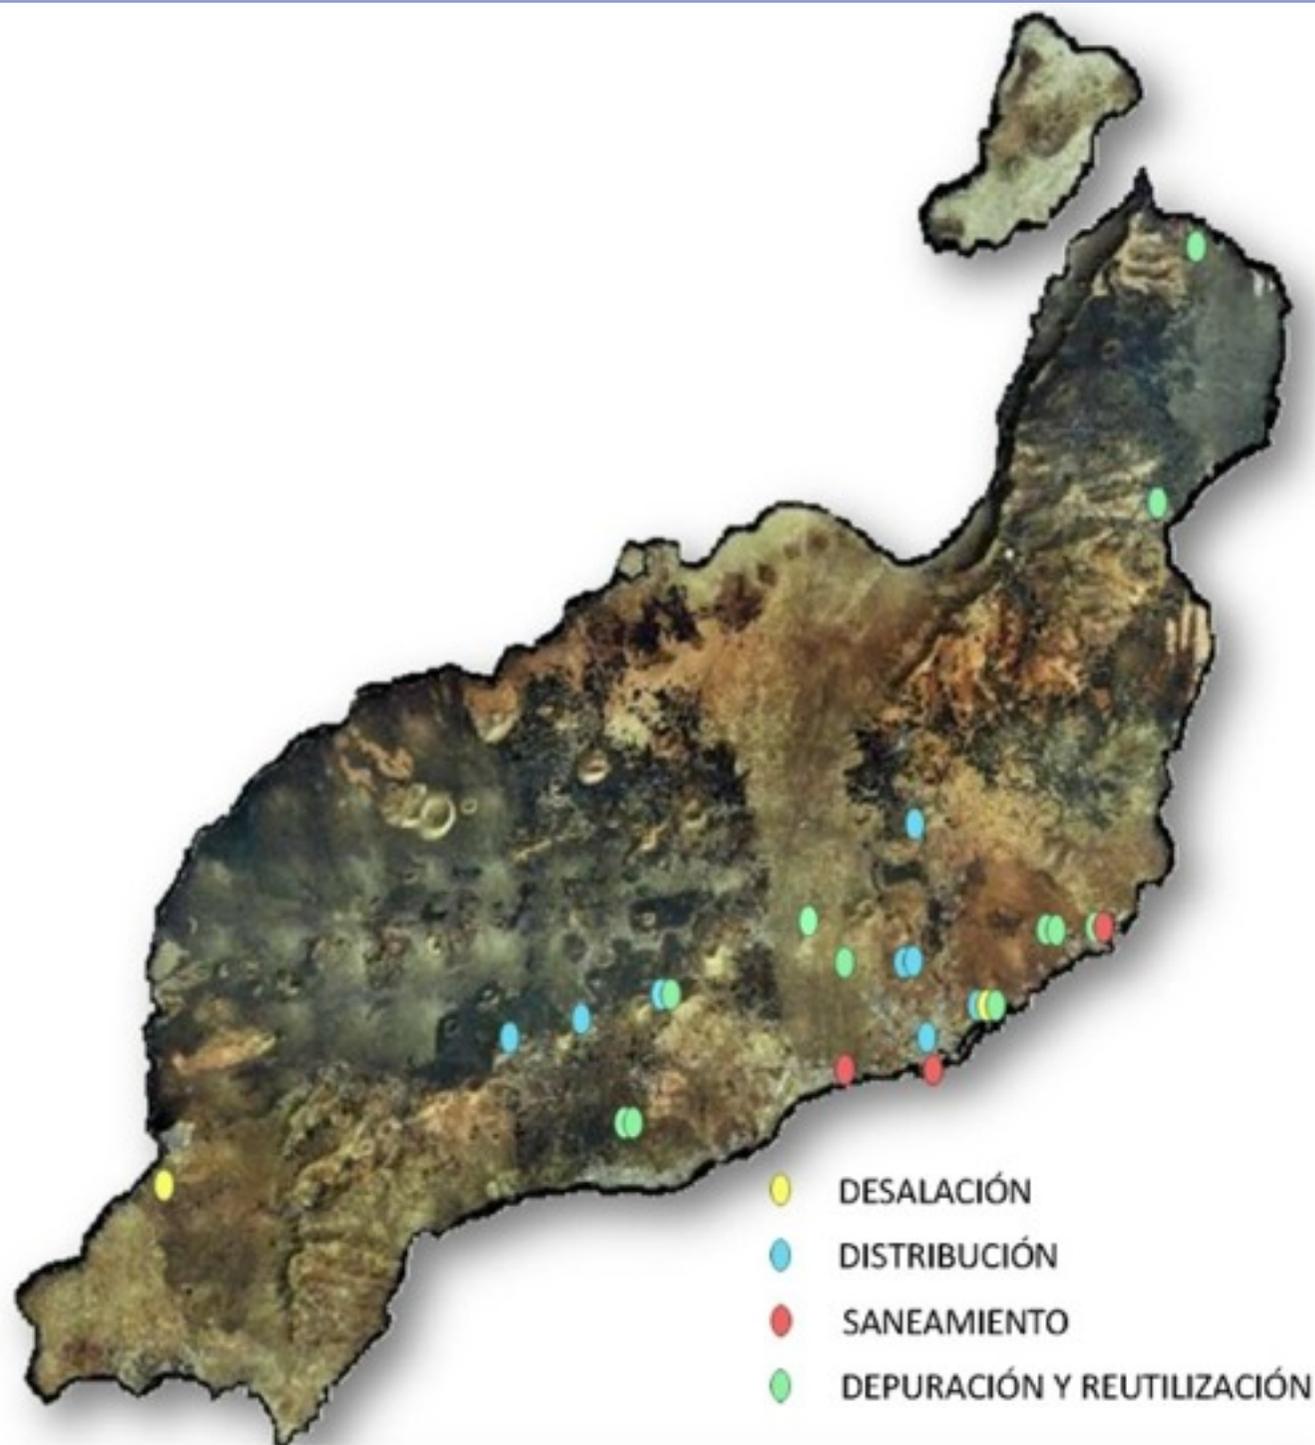



Consortio del Agua de Lanzarote

Canal 
Gestión Lanzarote
