

BALANCE OBRAS-INVERSIONES DESDE 2013 A ABRIL 2018

Período: junio 2013 a abril 2018

Comunicación y Relaciones
Institucionales

20.04.2018

Índice

1. Situación balance plan inversor de Canal Gestión Lanzarote pag. 3-4
2. Situación balance plan inversor por localización geográfica pag. 5
3. Obras inversiones ejecutadas y en funcionamiento pag. 6-8
4. Obras inversiones ejecutadas y en funcionamiento por municipios pag. 9-23
5. Obras inversiones en ejecución pag. 24-26
6. Obras inversiones en ejecución por municipios pag. 27-33
7. Obras inversiones en licitación pag.34-35
8. Obras inversiones paralizadas pag 36-37

Balance Plan Inversor Canal Gestión Lanzarote 2013-2018

Inversión comprometida a julio 2013 **54.456.000 €**

Inversión comprometida a julio 2018) **56.000.000 €**
(estimación según valor del dinero en la fecha de julio)

Inversión ejecutada-certificada

(actuaciones e inversiones realizadas desde julio de 2013 a abril de 2018)

Importe que corresponde a obra ejecutada, inversión certificada a abril 2018 y parte certificada obras paralizadas)

45.929.058 €

Inversión comprometida, pendiente de certificar

(parte actuaciones que no están certificadas porque están en ejecución y licitaciones en trámites)

Importe correspondiente a parte sin certificar de obras en ejecución, inversión prevista en licitación y parte sin certificar de obras paralizadas)

14.656.520 €

60.585.578 €

En ejecución actualmente hay 53 millones de euros,

lo que hace que el nivel de ejecución sea del 94,5% , quedando por certificar el 12,5%

La inversión certificada actualmente asciende a 46 millones de euros,

lo que hace que el nivel de ejecución sea del 82%

Balance Plan Inversor Canal Gestión Lanzarote 2013-2018 POR MUNICIPIOS


	Obra ejecutada	Obra-Inversión en ejecución			En licitación. Inversión total prevista	Paralizadas	
		Inversión certificada a abril 2018	Parte sin certificar	Total inversión prevista		Parte certificada	Sin certificar
Arrecife	1.499.007	5.765.639	1.355.153	7.120.792			
Haría	1.717.089						
Teguise	3.770.359	1.600	58.900	60.500		114.789	101.042
S. Bart.	44.329	144.810	185.190	330.000		38.748	110.000
Tías	3.840.723	3.633	51.367	55.000			
Tinajo	184.393						
Yaiza	3.988.859	2.901.203	2.170.622	5.071.825		382.941	98.066
De ámbito insular	11.294.780	10.236.156	3.777.286	14.013.442	6.748.894*		
SUBT.		19.053.041 €	7.598.518 €			536.478	309.108
TOTAL	26.339.539 €	26.651.559 €			6.748.894 €	845.586 €	

* Es el precio máximo de licitación, supeditado a la adjudicación definitiva

1

OBRAS INVERSIONES EJECUTADAS

Obras e inversiones ejecutadas y en funcionamiento desde 2013 –abril 2018 por municipios

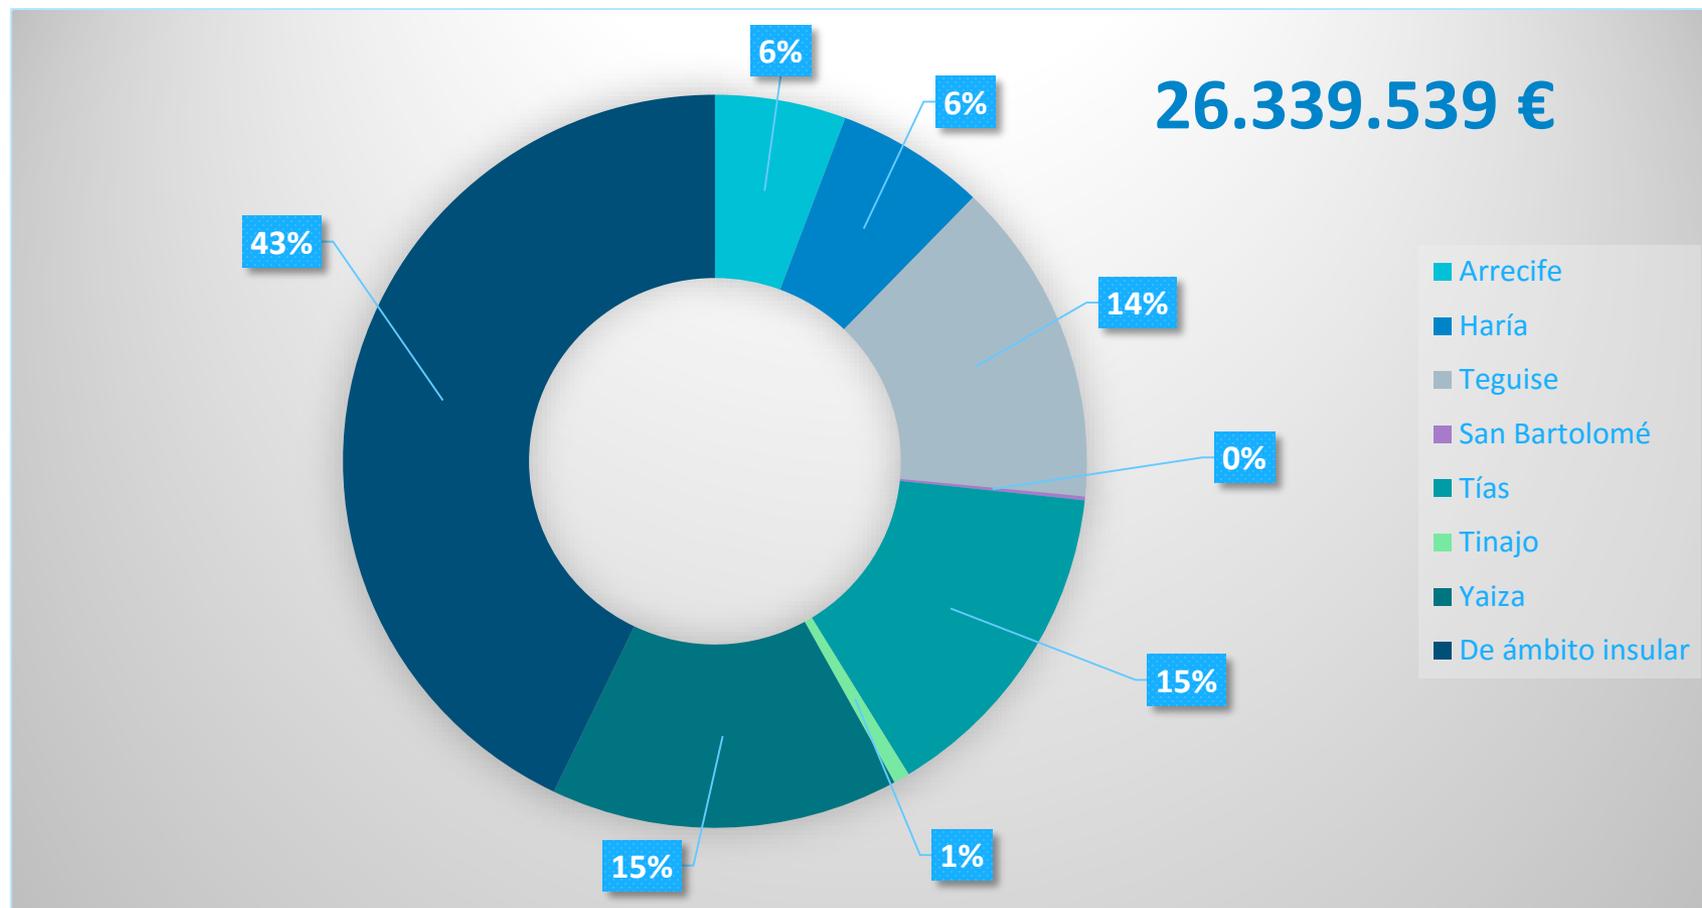

Obras e inversiones ejecutadas de ámbito insular hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada
Mejoras atención al Cliente	
Adecuación oficinas Comerciales Locales (en municipios)	226.011
Adecuación del edificio Oficinas Centrales Central Díaz Rijo	82.261
	308.272 €
Puesta a punta desaladoras de la Central Díaz Rijo	
Renovación Lanzarote IV	4.705.790
Renovación cubierta Lanzarote IV	53.625
Adecuación de la EDAM Lanzarote V	6.344
	4.765.759 €
Mejoras generales en la Central de Desalación Díaz Rijo	
Legalización grupo electrógeno	7.158
Legalización instalación contra incendios	25.523
Legalización almacenamiento productos químicos	6.671
Reforma ventilación centro transformación Lanzarote III	43.943
Legalización instalación eléctrica Lanzarote III y IV	33.530
Depósito para almacenamiento sosa cáustica	20.844
Sustitución acoplamiento victaulic fase I	25.315
Reestructuración almacén general	41.832

Obras e inversiones ejecutadas de ámbito insular hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada
Sustitución acoplamiento victaulic fase II	6.459
Almacenamiento y dosificación hipoclorito sódico	94.729
Adecuación depósito agua producto de Punta de Los Vientos	174.743
Adecuación del emisario Central Díaz Rijo	109.297
Motores nuevos alta eficiencia	14.779
Rehabilitación de antiguo molino salinero en Central Díaz Rijo	5.896
Demolición de mediana en Central Díaz Rijo	31.317
Demolición antigua nave Río Tinto en Central Díaz Rijo	28.524
Limpieza y adecuación de antiguos depósitos de fuel oil en Central Díaz Rijo	144.422
Adecuación de nave para garaje de parque móvil en Central Díaz Rijo	28.169
Adecuación del edificio Lanzarote I en Central Díaz Rijo	91.261
Adecuación del edificio de Producción en Central Díaz Rijo	20.633
Adecuación del edificio Centro Social en Central Díaz Rijo	10.801
Adecuación Punta de Los Vientos	39.019
Adecuación para nuevos talleres en Central Díaz Rijo	154.992
Adecuación de nave para vestuarios en Central Díaz Rijo	157.840
Red saneamiento Punta de Los Vientos	104.099
	1.421.796 €

Obras e inversiones ejecutadas de ámbito insular hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada
Mejoras Abastecimiento-distribución	
Construcción nuevo depósito Zonzamas	3.317.479
Demolición depósitos I, II, III y IV La Granja	111.072
Renovación válvulas de la red en mal estado	10.941
Conexiones red de transportes Las Breñas Playa Blanca con redes Playa Blanca	7.142
	3.446.634 €
Depuración	
Mejoras generales den depuración	40.907
Suministro e instalación equipos vertidos de terceros	53874
	94.781 €
Agua regenerada	
Tubería agua regenerada	6.961
Renovación de los tratamientos terciarios	1.137.514
Reparación vallado balsa Maneje-agua regenerada	27.488
	1.171.963 €
Tecnología y seguridad	
Construcción de nuevo CPD	53.633
Legislación radio-modems	1.375
Sistema de videovigilancia en la Central Díaz Rijo	30.567
	85.575 €

Obras e inversiones ejecutadas en Arrecife hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada
Renovación red calle Toledo en Arrecife	44.177
Rehabilitación depósitos Maneje	19.040
Reparación cubiertas de Maneje	47.414
Retirada cubierta flotante de la balsa Maneje	18.912
Acondicionamiento de la obra de llegada del colector de San Bartolomé a la EDAR de Arrecife	6.414
Tubería saneamiento calle José Antonio	19.659
Vallado Arrecife	24.118
Reparación emisario Naos-Arrecife	54.506
Demolición antigua EBAR Portugal	53.599
Renovación EBAR Portugal (antigua y nueva)	893.147
Sustitución colector emisario de Arrecife	22.048
Desconexiones acometidas irregulares conectadas al canal de pluviales en Arrecife (Portugal-Punta del Camello)	39.211
Reparación arqueta e instalación de válvula antiretorno en el interior de las instalaciones del Hospital Insular	2.712

Obras e inversiones ejecutadas en Arrecife hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada
Renovación tramo red saneamiento calle Puente en Arrecife	11.515
Bypass calle Coronel Bens	5.463
Ejecución de trabajos de restauración de depósitos Las Maretas del Estado	135.976
Habilitación de tanques de tormentas en la antigua EDAR Arrecife I	60.112
Puesta en servicio telelectura de consumo agua potable en La Destila	40.984
	1.499.007 €

Obras e inversiones ejecutadas en Haría hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada
Renovación red calle Arco Iris en Arrieta	5.842
Renovación red Órzola	206.718
Renovación red Punta Mujeres y Arrieta	944.927
Adecuación depósito Guatifay	31.869
Adecuación depósito Gral del Norte	35.192
Adecuación depósito EB Máguez	26.237
Adecuación depósito Órzola	41.023
Adecuación depósito EB Tabayesco	34.370
Adecuación depósito EB Punta Mujeres	46.864
Adecuación depósito EB Mala	48.673
Adecuación depósito EB Arrieta I	32.251
Adecuación depósito EB Arrieta II	20.901
Adecuación depósito estación de bombeo de Temisa	179
Adecuación depósito estación de bombeo Trujillo Alto	9.815
Adecuación depósito estación de bombeo Haría Elvira Sánchez	4.359
Adecuación depósito estación bombeo Ye	1.485
Tubería alcantarillado Barranco Tenesía	226.384
	1.717.089

Obras e inversiones ejecutadas en Teguisse hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada
Nueva red agua regenerada de Costa Teguisse	399.582
Reforma integral de la depuradora de Costa Teguisse	695.373
Renovación red calle Rafael Alberti en Tahíche	36.074
Renovación red calle Lucas Gutiérrez en Tahíche	6.581
Renovación red calle Emilio Castelar	4.377
Renovación red calle Los Pescadores-Soo	12.336
Renovación red Teguisse	755.656
Renovación red abastecimiento calle Acorán en Teseguite	64.361
Renovación red calle Arroró en Los Valles	33.013
Impulsión Costa Teguisse	535.678
Abastecimiento agua potable a Famara	368.494
Tubería conexión depósito La Graciosa	2.275
Reparación vallado agua regenerada Iryda	8.657
Adecuación depósito Tahíche	46.390
Adecuación depósito Tao	42.124
Adecuación depósito Los Valles	49.277
Adecuación depósito estación de bombeo Tao	33.423
Adecuación depósito estación de bombeo Los Valles	29.136

Obras e inversiones ejecutadas en Teguisse hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada
Adecuación depósito Guatiza	55.381
Adecuación depósito Nazaret	27.949
Adecuación depósito Urbanización Famara	20.022
Adecuación depósito Caleta Famara	43.989
Adecuación depósito Muñique	34.717
Adecuación depósito Chimida	430
Adecuación depósito Mozaga Bajo	4.665
Adecuación depósito Guatiza Bajo	8.449
Adecuación depósito EB La Graciosa	3.760
Adecuación depósito Guatiza Alto	15.093
Adecuación depósito Soo	33.780
Adecuación depósito estación bombeo Nazaret	7.137
Adecuación depósito Costa Teguisse	217.741
Adecuación depósito Las Maretas de La Graciosa	36.429
Adecuación depósito estación de bombeo Bugarvillas	3.245
Adecuación depósito EB Los Roferos	1.649
Renovación red saneamiento en paseo marítimo Costa Teguisse, zona EBAR caseta E Playa Las Cucharas	23.612
Renovación red saneamiento en paseo marítimo de Costa Teguisse (zona Playa Bastián)	32.770
Puesta en servicio telelectura de consumo de agua potable en La Graciosa	76.734
	3.770.359

Obras e inversiones ejecutadas en San Bartolomé hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada
Adecuación depósito Playa Honda	5.417
Adecuación depósito Montaña Blanca Bajo	18.497
Adecuación depósito Montaña Blanca	20.415
	44.329

Obras e inversiones ejecutadas en Tías hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada
Sustitución equipos de bombeo de agua regenerada para riego en EDAR Tías	5.606
Renovación del colector de recirculación de la EDAR de Tías	4.273
Mejoras EDAR Tías	52.290
Ampliación de la red de agua regenerada en Camino de las Quinzuelas, Tías	24.228
Rehabilitación de la red de distribución de agua regenerada de Tías	52.690
Renovación red calle Lomo Martín-Mácher	5.845
Renovación calle Libertad-Tías	43.126
Renovación red calle Venecia en Puerto del Carmen	3.471
Adecuación depósito estación bombeo Las Vegas La Asomada	4.700
Renovación red camino del Callao II La Asomada	33.207
Renovación red camino del Callao I La Asomada	12.349
Renovación red camino La Vega-Tías	1.198
Renovación red agua potable entre el depósito La Candelaria y la Avda Central Tías	296.519
Renovación red calle Salinas de Puerto del Carmen	31.844
Renovación red Mácher	1.251.124
Adecuación depósito EB TEgoyo	27.784
Adecuación depósito Tías Alto	20.609

Obras e inversiones ejecutadas en Tías hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada
Adecuación depósito Matagorda	91.100
Adecuación depósito Los Mojones	42.468
Adecuación depósito Macher	4.867
Adecuación depósito Fariones Bajo	2.416
Adecuación depósito estación bombeo El Mentidero Masdache	840
Adecuación depósito estación bombeo El Valeriano Conil	1.044
Adecuación depósito Fariones Cangrejo	31.719
Adecuación depósito EB La Cancela	5.374
Adecuación depósito estación de bombeo Caldereta-La Asomada	8.377
Nuevo tramo tubería de abastecimiento a Pto. Del Carmen DN 400 pvc	204.773
Adecuación red calle Roque del Este y calle Montaña Clara Pto del Carmen	2.117
Renovación EBAR Puerto del Carmen	1.510.338
Renovación EBAR Muellito Puerto del Carmen	3.033
Adecuación del emisario de Tías a la altura del CC Acuario	39.936
Instalación de variadores en la EBAR Noruega de Puerto del Carmen e Intermedia de Arrecife	21.458
	3.840.723 €

Obras e inversiones ejecutadas en Tinajo hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada
Cambio red calle Reglita Bethencourt La Vegueta	3.836
Renovación red calles El cuchillo y Los Arenales El Cuchillo	36.006
Adecuación depósito El Calvario	43.085
Adecuación depósito El Cuchillo	30.173
Adecuación depósito La santa	30.145
Adecuación depósito estación de bombeo Tinguatón	3.066
Adecuación depósito estación de bombeo Las Huertitas La Vegueta	490
Puesta en servicio telelectura de consumo de agua potable en El Cuchillo	37.592
	184.393 €


Obras e inversiones ejecutadas en Yaiza hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada
Mejoras EDAR Montaña Roja	36.839
Renovación red Las Breñas	780.737
Impulsión Janubio Las Breñas	619.670
Adecuación tubería camping Papagayo	1.783
Renovación red Las Breñas-Playa Blanca fase I	841.401
Renovación red Las Breñas-Playa Blanca Fase II	780.977
Renovación red entre Femés y Las Casitas de Femés	23.799
Adecuación y retirada de tubería de FD red de Uga a Yaiza	68.895
Adecuación arquetas Puerto Calero y Cortijo Viejo	10.271
Adecuación depósito La Atalaya	59.056
Adecuación depósito Maciot	30.760
Adecuación depósito estación de bombeo Vallito Uga	1.757
Adecuación estación de bombeo La Degollada	12.402
Adecuación depósito EB Las Breñas	157.403
Adecuación depósito Femés	87.207
Tubería evacuación salmuera Janubio	137.268

Obras e inversiones ejecutadas en Yaiza hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada
Adecantamiento cuadro eléctrico Janubio	40.692
Adquisición grupo electrógeno para Janubio	9.643
Ampliación temporal de producción de agua EDAM Janubio	44.271
Mejoras centro de transformación EDAM Janubio	83.139
Caseta productos químicos Janubio	9.208
Legalización EDAM Janubio	18.463
Renovación EBAR Intermedia Playa Blanca	22.136
Adecuación de la cubierta de Janubio	44.229
Obras complementarias a la remineralizadora de Janubio	66.853
	3.988.859 €

Obras e inversiones ejecutadas y en funcionamiento desde 2013 –abril 2018

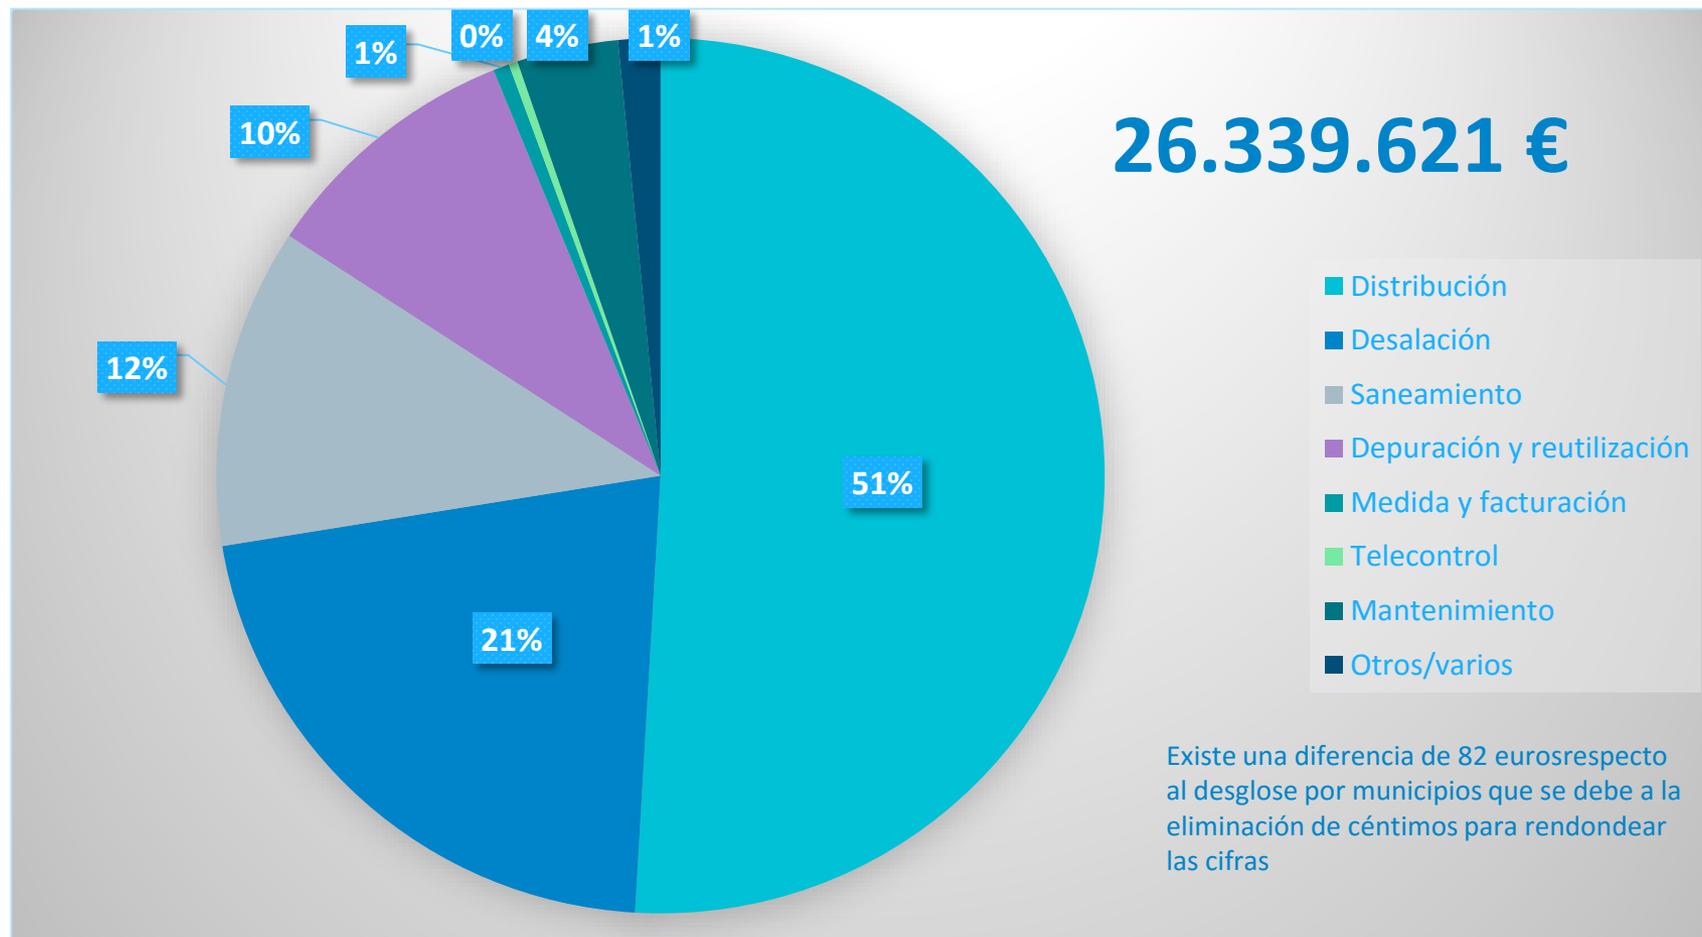


Obras e inversiones ejecutadas y en funcionamiento desde 2013 –abril 2018

Departamentos responsables de la inversión	Inversión certificada
Distribución	13.411.915
Desalación	5.665.100
Saneamiento	3.109.753
Depuración y reutilización	2.535.468
Medida y facturación	155.312
Telecontrol	85.576
Mantenimiento	972.677
Otros/Varios	403.820
TOTAL	26.339.621

2

OBRAS-INVERSIONES EN EJECUCIÓN

Obras e inversiones en ejecución abril 2018 por municipios

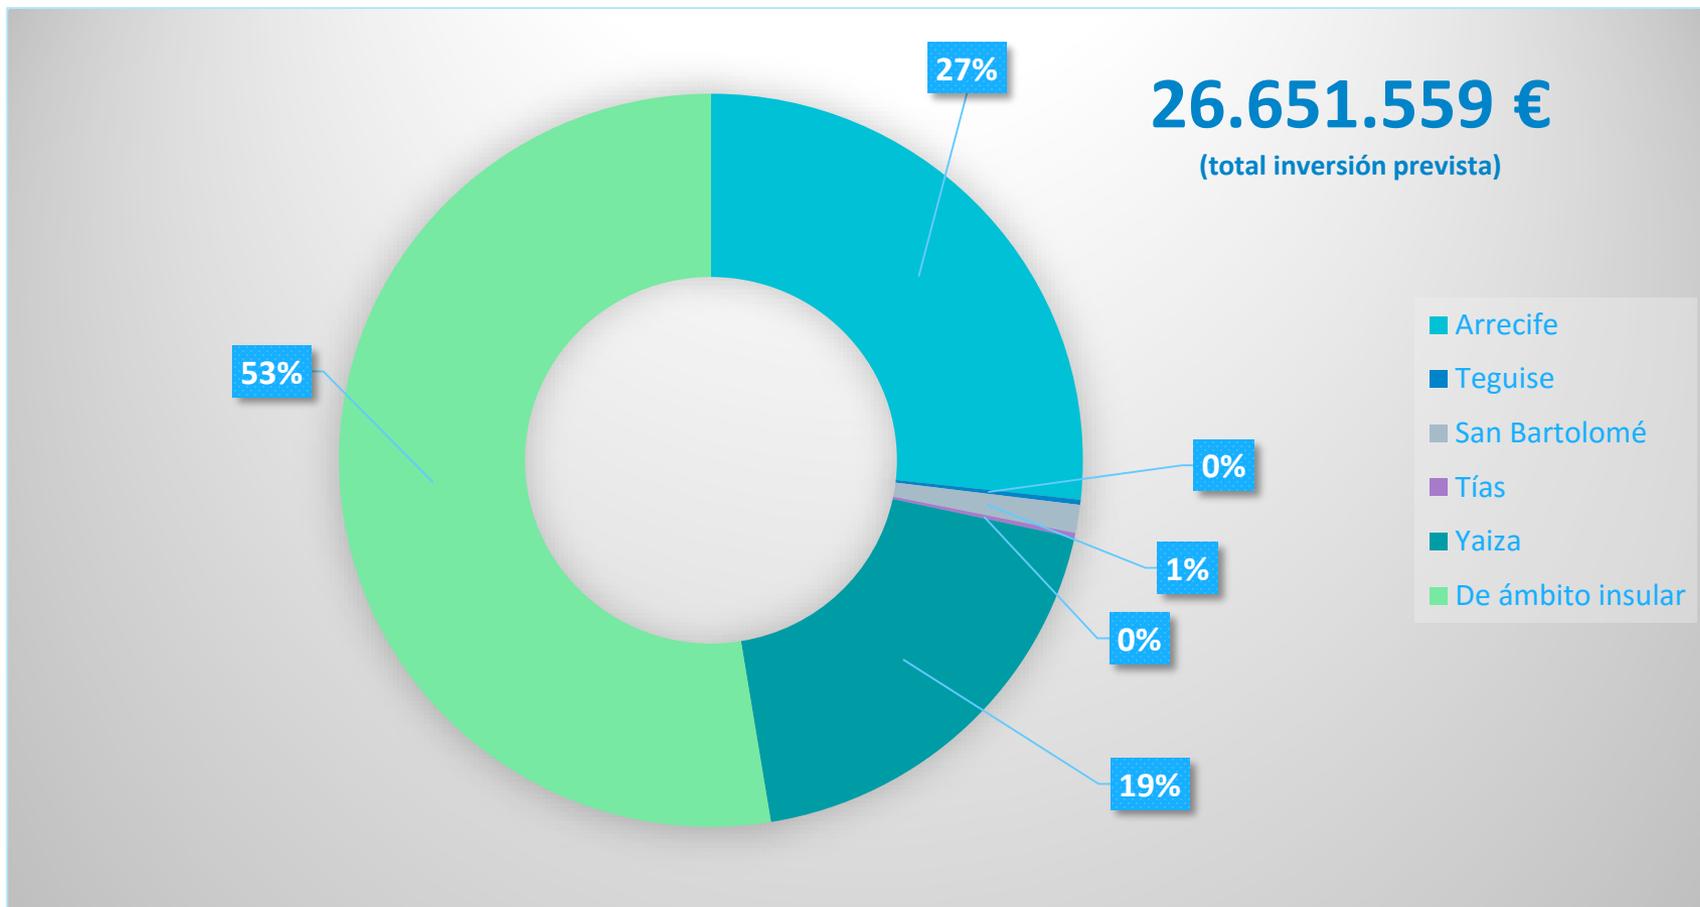

Obras e inversiones en ejecución de ámbito insular hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada	Inversión prevista total aproximada
Mejoras Abastecimiento-distribución		
Nueva estación de bombeo agua potable Zonzamas	1.815.517	2.259.723
EBAP Punta de Los Vientos	426.598	2.365.000
Levantamiento topográfico y digitalización de las infraestructuras	454.352	707.922
Impulsión Maneje Montaña Mina	2.396.081	2.533.482
Construcción red de transporte de agua del depósito Lomo de Tesa a depósito de Yaiza	2.799.702	3.074.105
	7.892.250 €	10.940.232 €
Tecnología y seguridad		
Telecontrol del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa	2.343.906	3.073.210
	2.343.906 €	3.073.210 €

Obras e inversiones en ejecución en Arrecife hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada	Inversión prevista total aproximada
Renovación red zona centro casco Arrecife	3.201.986	3.441.941
Renovación red zona centro norte Arrecife	2.520.670	3.557.100
Adecuación depósito general Montaña Mina	9.232	88.000
Adecuación depósitos de Arrecife fase I	33.751	33.751
	5.765.639 €	7.120.792 €


Obras e inversiones en ejecución en Teguiise hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada	Inversión prevista total aproximada
Adecuación estación intermedia Los Valles	614	33.000
Adecuación depósito estación de bombeo Parque Eólico y Peñas del Chache	985	27.500
	1.600 €	60.500 €

Obras e inversiones en ejecución en Yaiza hasta abril 2018

Denominación actuación	Inversión certificada	Inversión prevista total aproximada
Adecuación depósito Uga	614	55.000
Reforma EDAM Janubio	2.900.589	5.016.825
	2.901.203 €	5.071.825 €

Obras e inversiones en ejecución a abril 2018

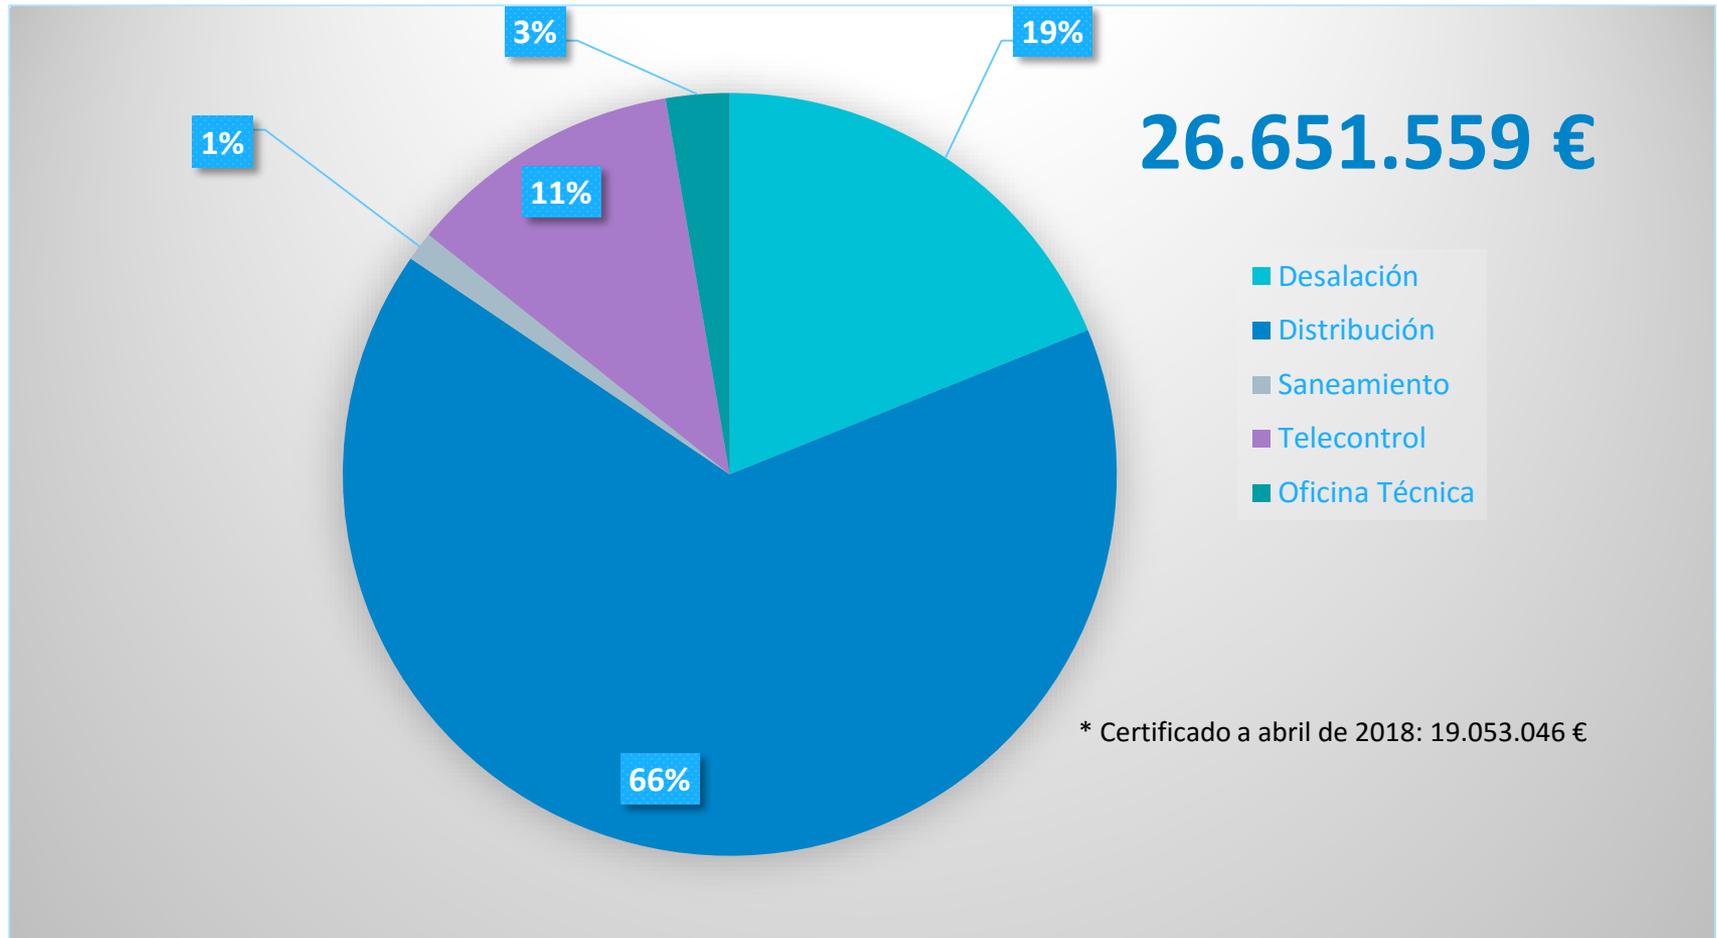

Obras e inversiones en ejecución a abril 2018

Departamentos responsables de la inversión	Inversión certificada	Inversión prevista al final aprox.
Distribución	13.209.388	17.523.602
Desalación	2.900.589	5.016.825
Saneamiento	144.810	330.000
Telecontrol	2.343.906	3.073.210
Oficina Técnica	454.352	707.922
TOTAL	19.053.045 €	26.651.559 €

3

OBRAS-INVERSIONES EN LICITACIÓN

Obras e inversiones en licitación a abril 2018

Inversión-obra	Inversión prevista del proyecto según presupuesto max licitación oficial
Renovación de la IDAM Lanzarote III (Desalación y de interés general)	4.948.894
Telemida y renovación general de contadores (Medida y Facturación, y de interés general)	1.800.000
TOTAL	6.748.894 €

4

OBRAS-INVERSIONES PARALIZADAS

Obras e inversiones paralizadas a abril 2018

Inversión-obra (Distribución)	Inversión certificada (parte de la obra ejecutada)	Inversión prevista del proyecto aproximada
Adecuación depósito Teguisse (Teguisse)	101.210	111.331
Renovación red submarina La Graciosa (Teguisse)	13.578	104.500
Construcción estación bombeo depósito Uga (Yaiza)	382.941	481.007
Depósito Montaña Blanca (Tesa) y conexiones a la impulsión (San Bartolomé)	38.748	148.748
TOTAL	536.477 €	845.586 €



www.canalgestionlanzarote.es
